

Calendarización


Universidad Nacional de Lanús
2do Cuatrimestre 2022

Objetivo de la clase

Comprender la calendarización del desarrollo de los productos y la relación con el MVP y los releases.

Introducción

Desarrollo ágil

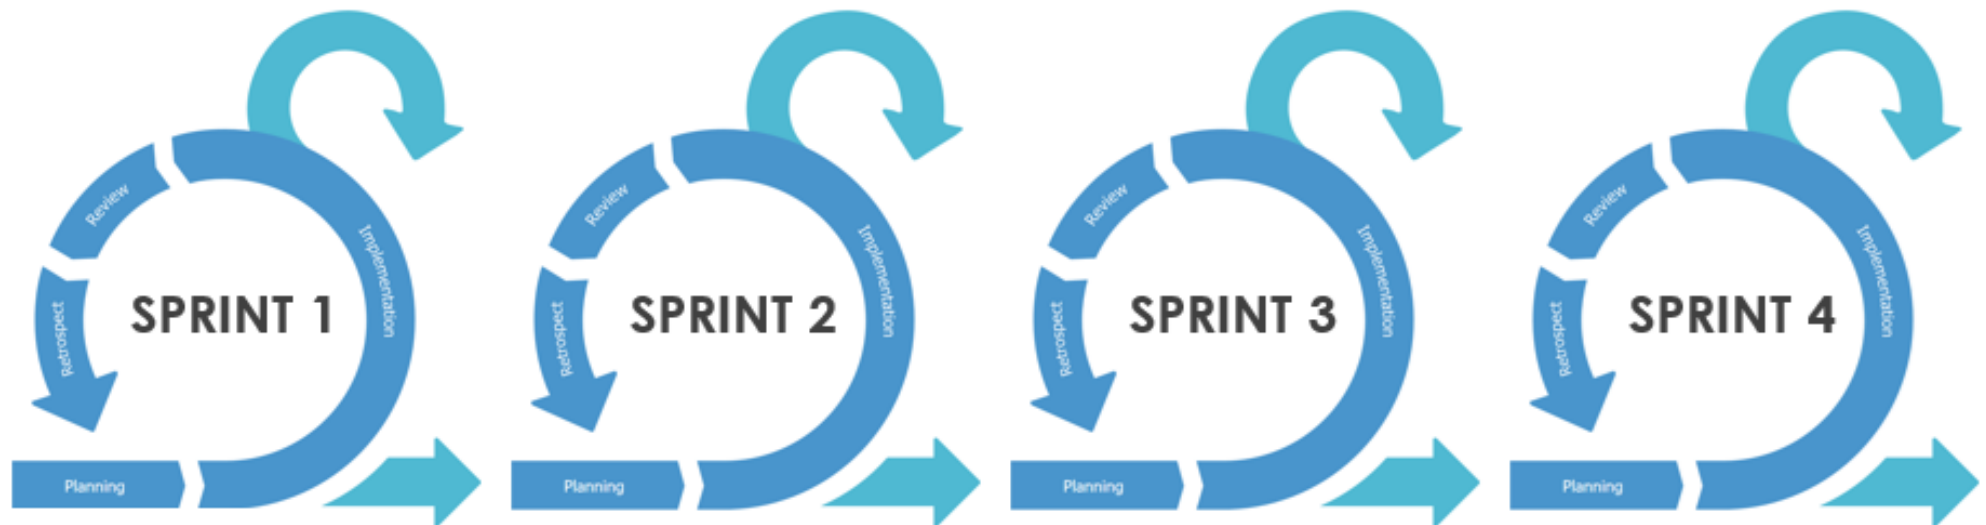


¿Cómo sabemos qué PBI
incluir en un sprint?



Prioridad

- La define el PO en función del aporte de valor de cada PBI.
- Define la gestión del backlog y el desarrollo del producto.

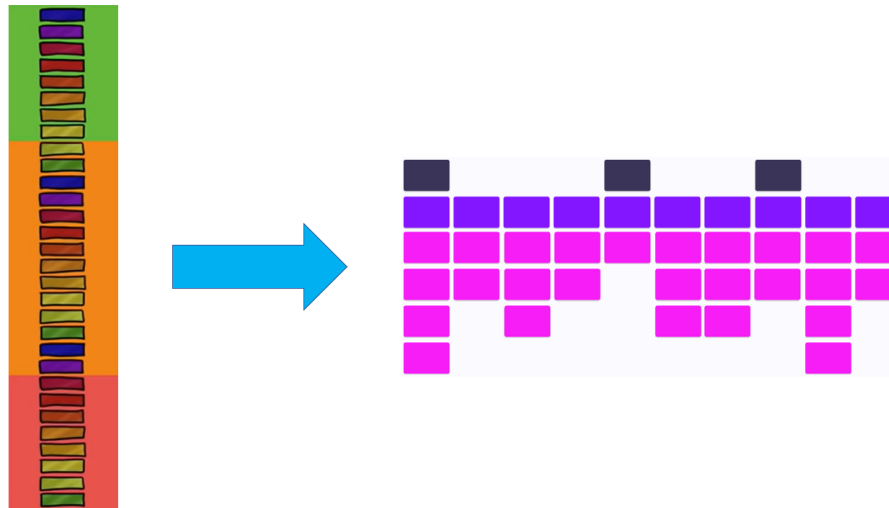

Definición de Listo o DoR (Definition of Ready)

Es un acuerdo co-creado por el equipo, que se aplica a todos los ítems a desarrollar.

Representa un conjunto mínimo de condiciones a cumplir para que el equipo pueda iniciar un trabajo de calidad sobre cada ítem.

Algunos criterios para DoR

- Las dependencias están resueltas.
- El equipo puede definir el cómo.
- Valor de negocio definido.
- El ítem está definido y registrado claramente.
- No tiene sentido subdividir más.
- (Se basan en INVEST)

<https://www.elproximopaso.net/2018/12/dor-kards.html>

Velocity.


Es la sumatoria del valor estimado de todas las historias de usuario que el equipo terminó durante una iteración.

¿Para qué sirve?

- Permiten definir con cuántas historias se va a comprometer el equipo de desarrollo.
- Permite estimar cuántas iteraciones serán necesarias para desarrollar el producto.

Ejemplo

Inicio del sprint	
User Story	Estimación
US01	3
US02	5
US03	3
US04	2



Fin del sprint	
User Story	Estado
US01	100%
US02	80%
US03	100%
US04	100%



Velocity = 8


*Sólo cuentan las que
están al 100%*

*Si la sumatoria de los PBLs del backlog es 80, vamos a
necesitar 10 iteraciones más para finalizar el producto.*



La velocity... ¿es fija o variable?

¿Cómo sabemos qué PBI
del sprint está terminado?



DoD

Lo define el Equipo en
forma colaborativa

Definición de Terminado o DoD (Definition of Done)

Es un acuerdo co-creado por un equipo, que se aplica a todos los ítems a desarrollar.

Incluye un conjunto mínimo de condiciones a cumplir para alcanzar el nivel de compleción y calidad acordado en cada ítem de trabajo.

Algunos criterios para DoD

- El PO ha visto la demo del producto.
- Se ejecutaron las pruebas necesarias.
- Se cumplen con los estándares de código.
- El producto está disponible en el entorno de desarrollo y/o producción.
- Se actualizó la documentación relevante.
- ...

<https://www.elproximopaso.net/2017/07/dod-kards.html>

Slicing



"Working software is the primary measure of progress".

"Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software".

"Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is essential".

"Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale".

¿Qué es el “slicing”?

“Dividir” o “rebanar” es una práctica que permite reducir la complejidad y el esfuerzo requerido para entregar valor al cliente de la forma más simple y rápida.



¿Para qué sirve?

- Favorece a la estimación (del valor y del esfuerzo).
- Mejora la priorización.
- Entrega de valor más rápidamente.
- Disminución del riesgo.
- Feedback temprano.

Tipos de Slicing

```
graph LR; A[Tipos de Slicing] --> B[Historias de Usuario]; A --> C[Producto];
```

Historias de Usuario

Buscamos HU más pequeñas, menos riesgosas, más fáciles y rápidas de desarrollar.

Producto

Buscamos versiones del producto que aporten valor y sean útiles en forma inmediata.

Slicing de User Stories



Las épicas son grandes paquetes de trabajo que deben subdividirse en historias de usuario.

Por lo general, abarcan varios sprints, equipos y hasta proyectos.

Criterios para subdividir

- Por flujo de trabajo.
- Por reglas de negocio.
- Por camino feliz/infeliz.
- Por datos o parámetros.
- Por operaciones (por ejemplo, CRUD).
- Por casos de prueba
- Otros.

<https://pablolischinsky.wordpress.com/2020/04/01/cartas-de-slicing>

<http://giovannycifuentes.com/tecnicas-y-patrones-de-division-de-historias-de-usuario-slicing>



Al subdividir una épica o una US, las US resultantes deben cumplir el criterio INVEST.

Actividad

¿Cómo podemos subdividir la siguiente épica?

Como cliente, quiero pagar los
productos en mi carrito de compra
para recibir en mi domicilio.

Posible solución

- Como cliente quiero ver el detalle y el monto del pedido para confirmar que estoy pagando lo que quiero.
- Como cliente quiero utilizar efectivo para pagar mi pedido.
- Como cliente quiero utilizar transferencia bancaria para pagar mi pedido.
- Como cliente quiero utilizar tarjeta de crédito para pagar mi pedido.
- Como cliente quiero utilizar tarjeta de débito para pagar mi pedido.
- Como cliente quiero utilizar MercadoPago para pagar mi pedido.
- Como cliente quiero utilizar PagoFácil para pagar mi pedido.
- Como cliente quiero recibir un mail con la confirmación del pago para contar con un recibo de la compra.
- Como cliente quiero visualizar las opciones de financiación para determinar cuál es más conveniente.
- ...

Slicing del producto o “Calendarización”

Calendarización

- La calendarización es la planificación temporal del desarrollo de los incrementos del producto.
- Calendarizamos en dos niveles:
 - Por iteraciones.
 - Por releases.

Release

- Es una versión liberada del producto que integra un conjunto de historias de usuario.
- Un “release plan” es el plan de entregas del proyecto.
- Un release puede ser el resultado de uno o más sprints.

Release Plan

- Permite alinear las expectativas del PO con el Equipo.
- Responde a preguntas como:
 - ¿Qué y cuándo se va a desarrollar?
 - ¿Qué funcionalidades voy a tener para un determinado momento?
 - ¿Cuánto va a costar?
 - ¿Cuáles son las fechas más críticas o importantes?

Entrega de Valor

- La entrega de valor se basa en la calendarización o release plan.
- Se puede entregar por:
 - Release.
 - Iteración.
 - Historia de Usuario (Continuous Delivery).



Pero... ¿necesitamos hacer esa
planificación?
¿Es correcto hacerla?



- Los frameworks ágiles por lo general ni la consideran.
- Podría ser considerada como una pérdida de tiempo y dinero.
- No entrega valor en sí misma.
- No puedo predecir a largo plazo.
- Las necesidades van a cambiar.
- Planifico features que quizás no necesite.




- Permite tener una definición de fechas y costos del proyecto.
- Brinda un contexto general del producto.
- Es una herramienta de comunicación (y aprendizaje).
- Permite satisfacer expectativas.
- Permite coordinar con terceros.

Entonces...



Tenemos que encontrar un balance

Release Planning

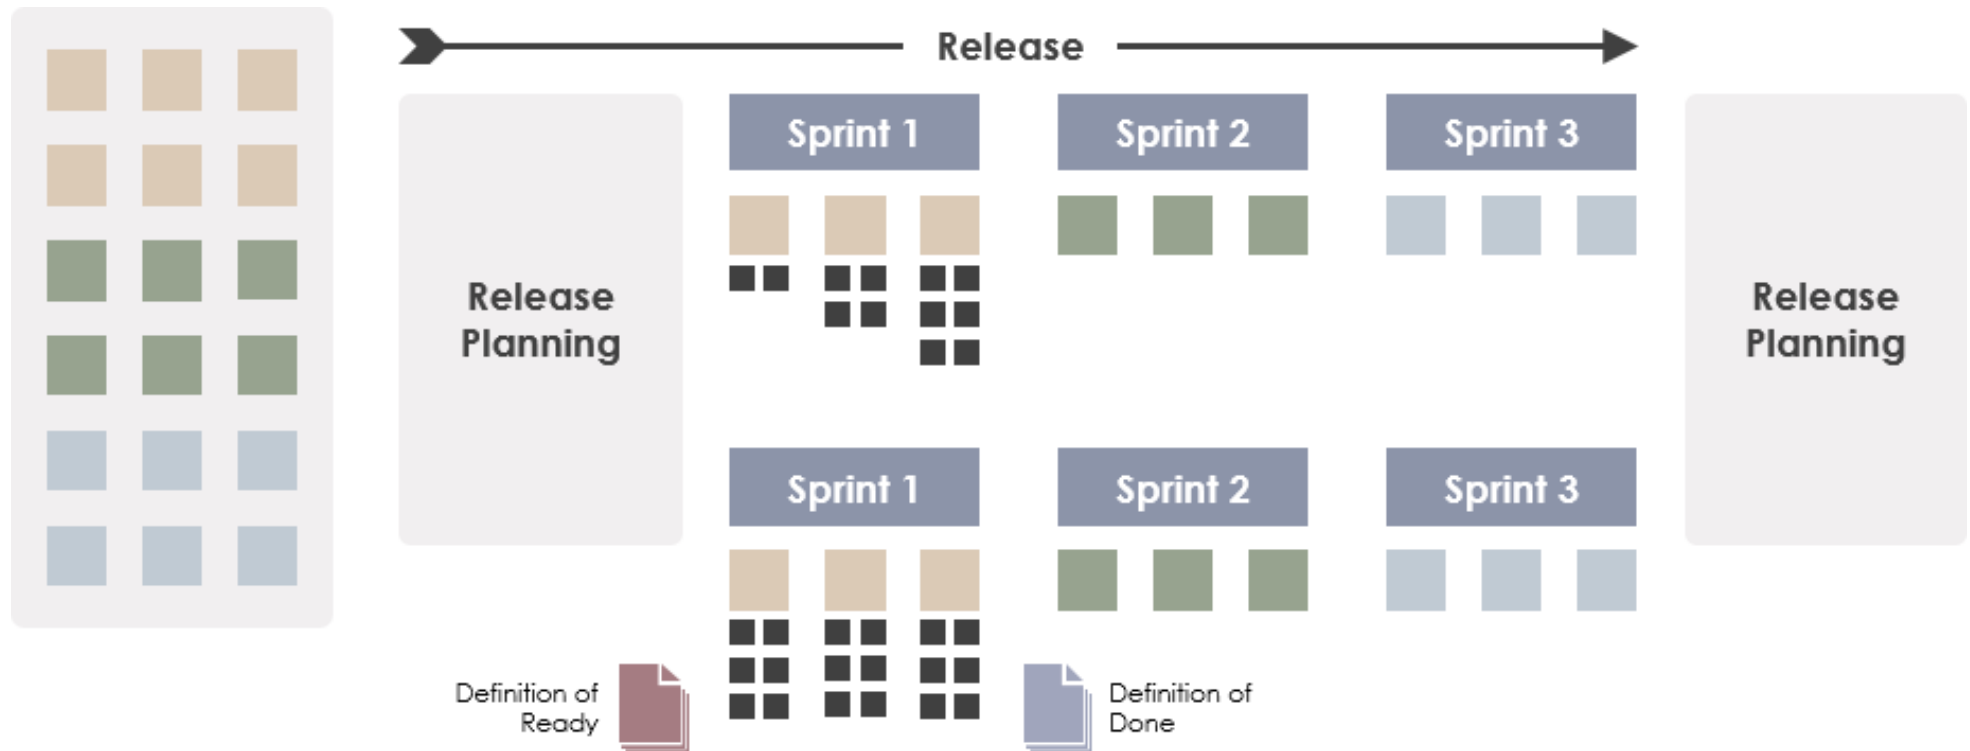

Estructura general de un Release Plan



Iteración cero

- Es una iteración inicial que no necesariamente ocurre en todos los equipos.
- Su duración es variable.
- Busca establecer ciertas bases, en caso de ser necesario.

Iteración cero

- Capacitación sobre el mindset agile.
- Preparar al equipo.
- Preparación inicial del backlog.
- Definición de las tecnologías a utilizar.
- Preparación de entornos (desarrollo, prueba, etc.).
- Definiciones de DoR, DoD.
- Estimaciones iniciales.

Iteración cero

La iteración cero “no” genera valor para el producto (no obtengo un incremento).



Muchos consideran que evidencia la incapacidad de un equipo de generar valor en forma inmediata.

Planificando por funcionalidad

Release Goals:

- (1) First release after user about to register, sign-in and sign-out.
- (2) Second release after user can successfully purchase items.
- (3) Final release when all the remaining stories are done.

First Release

Stories: 6, 2, 5, 10 -> Estimation = 8 Points
Estimation / Velocity = 8 / 3 = 3 Sprints

Second Release

Stories: 1, 3, 4, 9 -> Estimation = 15 Points
Estimation / Velocity = 15 / 3 = 5 Sprints

Third Release

Remaining stories -> Estimation = 3 Points
Estimation / Velocity = 3 / 3 = 1 Sprint

Releases after: sprint 3, 8, 9

ID	Story	Estimation	Priority
6	As a general user I want to register a new account.	3	1
2	As a member I want to sign-in my account.	2	2
5	As a member I want to sign-out my account.	1	3
10	As an administrator I want to disallow suspicious registration attempts.	2	4
1	As a member I want to add new items into shopping cart.	5	5
3	As a member I want to checkout shopping cart.	7	6
4	As a member I want to track the delivery.	2	7
9	As a member I want to record delivery addresses.	1	8
7	As a member I want to cancel order.	1	9
8	As an administrator I want to see the list of accounts logged in.	2	10
Total	26		

Planificando por fechas

Release Goals:

Release every 6 weeks

	ID	Story	Estimation	Priority
Release	6	As a general user I want to register a new account.	3	1
	2	As a member I want to sign-in my account.	2	2
	5	As a member I want to sign-out my account.	1	3
	10	As an administrator I want to disallow suspicious registration attempts.	2	4
Release	1	As a member I want to add new items into shopping cart.	5	5
	3	As a member I want to checkout shopping cart.	7	6
Release	4	As a member I want to track the delivery.	2	7
	9	As a member I want to record delivery addresses.	1	8
	7	As a member I want to cancel order.	1	9
Release	8	As an administrator I want to see the list of accounts logged in.	2	10
Total			26	

Velocity: 3 points / sprint

Sprint length: 2 weeks

Ejemplos



StoriesOnBoard

<https://storymapexamples.storiesonboard.com/m/webshop-example>

Conclusión

“Dividir” de manera tal que el usuario pueda ejecutar alguna acción de principio a fin, aunque sea pequeña.



Actividad para la semana que viene

- Armar el release plan del producto.
- Hacer foco en el MVP y en los sprints que quedan para su entrega.

[illegible]
